RAPPORT SUR LE SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES DANS LA COMMUNE D'ESEKA PAR LES JEUNES

2019-2020

Projet : Appui à la décentralisation et à la sécurisation digitale

TABLE DES MATIERES

I- PRESENTATION DE LA COMMUNE D'ESEKA

1- Historique…….....P2

2- Localisation géographique…….....P2

3- Les différents quartiers et villages……...P4

4- Les sites touristiques……....P5

II- GLOSSAIRE

III- TABLEAU DES PROJETS 2019

IV- TABLEAU DES PROJETS 2020

V- PROJETS REALISES ET MONTANTS

1- Projets réalisés en 2019……...P10
2- Projets réalisés en 2020……...P11

VI- PROJETS NON REALISES/EN COURS

1- Tableau des projets en cours de réalisation de la Commune d'Eséka en 2019……P12
2- Tableau des projets en cours de réalisation de la Commune d'Eséka en 2020 …….....P13

VII- CONSTATS

1- Observations sur les projets de 2019……..P15
2- Observations sur les projets de 2020……..P20

VIII- ANNEXES

IX- PRESENTATION DES JEUNES DELEGUES DE LA COMMUNE D'ESEKA

I- PRESENTATION DE LA COMMUNE D'ESEKA

1- Historique

Le nom « Eséka » provient de deux habitants de part et d'autre des collines qui entourent la localité qui à l'une de leurs rencontres s'appelèrent « Séga », qui veut dire **égal** en langue Basa'a d'où le nom officiel d'Eséka donné à la localité, suite à sa transformation par la colonisation. La Commune d'Eséka est une commune qui a été créée le 05 juillet 1954 par Arrêté n° 436 du Haut-Commissaire de la République Française au Cameroun.

2- La localisation géographique

La Commune d'Eséka, d'une superficie estimée à 965 km², est située à l'extrême sud du département du Nyong et Kelle, Région du Centre, à 35 km de la RN3, à 180 km de Douala par route et 153 km par rail, ainsi qu'à 130 km de Yaoundé par route en passant par Boumnyébél et 130 km par rail.

La Commune d'Eséka abrite la ville d'Eséka, chef-lieu du Département de Nyong et Kellé. Elle est limitée :

- Au Nord par la Commune de Ngog-Mapubi ;
- Au Sud par la Commune de Lolodorf (Département de l'Océan) ;
- A l'Est par les Communes de Makak et de Matomb ;
- A l'Ouest par les Communes de Biyouha et de Messondo.

La carte de la Commune d'Eséka

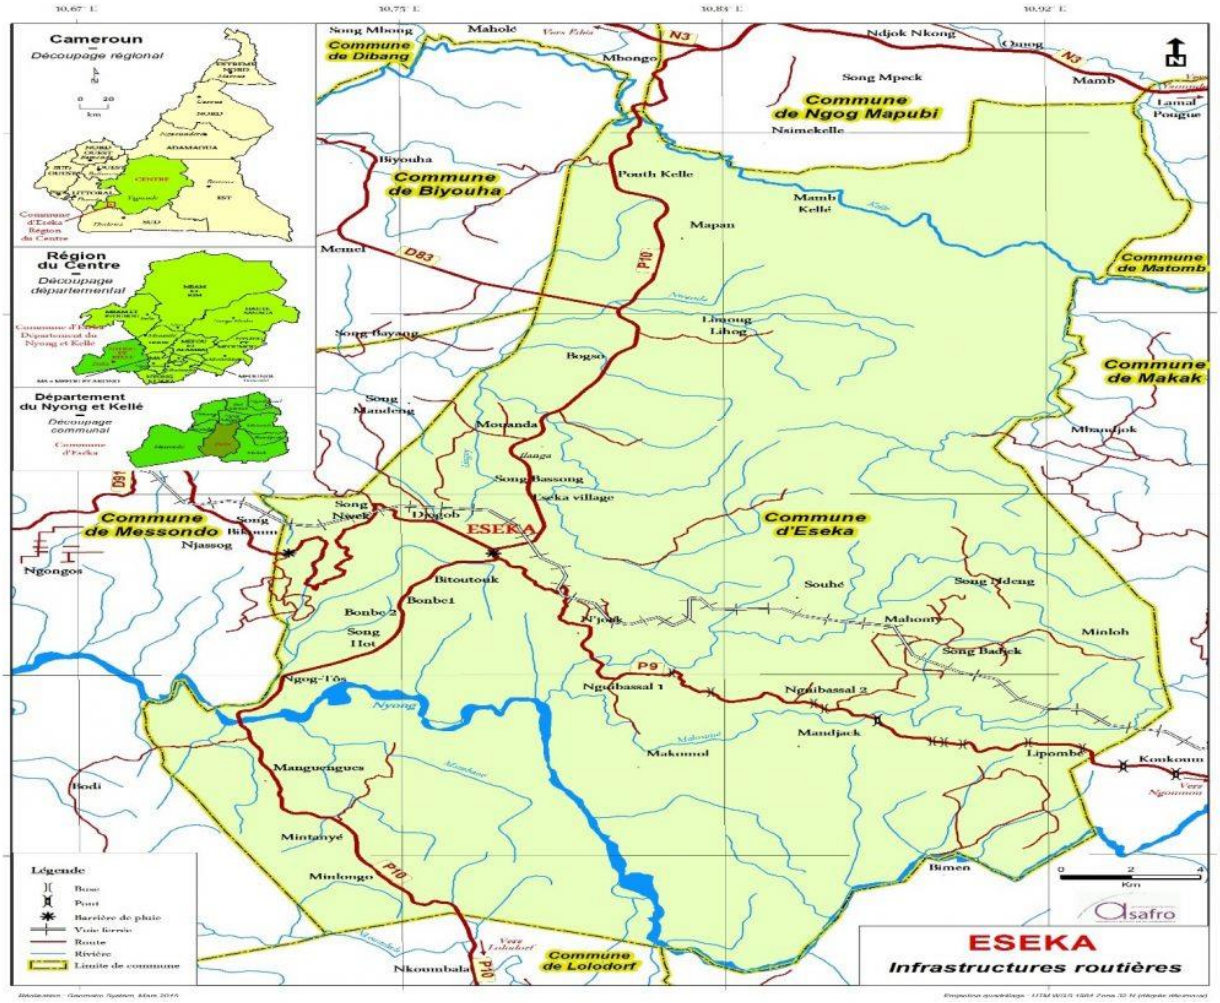

3- Les différents quartiers et villages

L'arrondissement d'Eséka est composé de plusieurs villages et quartiers. Nous les avons classifiés dans le tableau ci-après :

Villages	Quartiers
Pouth Kelle	Adna
Limoug Lihog	Camp fonctionnaire
Song Bikun	Cercle municipal
Djogob	Haoussa
Songdeng	Mayemi
Lisai	Bondjock
Songbadjeck	Pombe
Mahomy	Malla
Sohe	Lycée
Lipombe	Bitoutouck
Mandjack	Eséka 2
Nguibassal 1	Tetem
Nguibassal 2	Aviation
Njock	Sneck
Mintanye	Likabo
Manguengues	Briqueterie
Ngog TOS	Permanence
Song Hot	
Bonbe 1	
Bonbe 2	
Song Matip	
Song Bassong	
Mouanda	
Bogso	
Mapan	

4- Les sites touristiques

La commune d'Eséka regorge plusieurs sites touristiques parmi lesquels nous pouvons citer quelques-uns à savoir :

- Les tunnels de Ndjock qui sont classés patrimoine culturel national
- Song Bakana, cimétière des blancs à LimougLihog
- Le patriarcat Bombog Mayi Ma Matip à l'entrée de la ville d'Eséka
- Les chutes de Njock
- Le monument Um Nyobe
- Le tunnel de l'ancien chemin de fer de Minloh-Maloume
- La gare d'Eséka
- Les chutes de Makaï et Dipimpi à Lipombe
- Le lac Bois du Cameroun
- Les lacs municipaux

II- GLOSSAIRE

- **PMH** : Puits à motricité Humaine
- **CPFF** : Centre de Promotion de la Femme et de la Famille
- **CFR** : Centre de formation rural
- **BT** : Basse Tension
- **MT** : Moyenne Tension
- **BIP** : Budget d'Investissement Public
- **CAC** : Centimes additionnels communaux
- **CTD** : Collectivité Territoriale Décentralisée
- **FEICOM** : Fonds Spécial d'équipement et d'Intervention Intercommunale
- **MINMAP** : Ministère des Marchés Publics
- **MINEPAT** : Ministère de l'Economie, de la planification et de l'Aménagement du territoire
- **CP** : Crédit de paiement
- **AE** : Autorisation d'Engangement
- **PNDP** : Programme National de Développement Participatif

III- TABLEAU DES PROJETS 2019

Les projets de la Commune d'Eséka ont été répartis en 02 catégories durant ces deux dernières années :

N°	PROJETS DU BIP	MONTANTS
1	Travaux d'aménagement de la route Carrefour Nyong-Camtour de l'hôpital de District d'Eséka	140.000.000 FCFA
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Primaire d'Eséka Groupe 2	2.050.000 FCFA
3	Réhabilitation de l'école maternelle Aviation	20.000.000 FCFA
4	Réhabilitation de la toiture de la tribune du stade municipal d'Eséka	15.000.000 FCFA
5	Réhabilitation de la route communale Bogso-Limoug Lihog	27.777.700 FCFA
6	Aménagement de la route Eséka-Messondo phase 2	143.000 FCFA
7	Electrification du village Lipombe-Silom	35.000.000 FCFA
8	Construction d'un forage équipé de PMH CFR	8.000.000 FCFA
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Boondjock (Viaduc)	8.000.000 FCFA
10	Ouverture (Installation) de la radio communautaire d'Eséka	20.000.000 FCFA
11	Acquisition d'un groupe électrogène à la morgue de l'Hôpital de district d'Eséka	10.000.000 FCFA
12	Equipement de 02 salles de classe en 60 tables-bancs et 02 bureaux de maître à l'Ecole Primaire d'Eséka Groupe 2	2.050.000 FCFA
13	Acquisition des équipements dans le cadre de l'éducation inclusive à l'école primaire d'Eséka	4.999.000 FCFA

N°	PROJETS SOUS FONDS PROPRES DE LA MAIRIE (Financé par le FEICOM)	MONTANTS
1	Chantier de 11 mini réseaux d'adduction d'eau à énergie solaire et un forage	214.828.875 FCFA

IV- TABLEAU DES PROJETS 2020

N°	PROJETS DU BIP	MONTANTS
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe (Pombe)	19.000.000 FCFA
2	Construction de huit latrines au stade municipal d'Eséka	4.200.000 FCFA
3	Electrification du village Mandjack par Song Badjeck	28.120.000 FCFA
4	Electrification du village Pout-Kellé 1-Mapan 3 en BT et MT monophasée	20.533.000 FCFA
5	Electrification du village Silom en BT et MT monophasée	17.147.000 FCFA
6	Equipement en 25 tables-bancs et 02 bureaux de maître à l'Ecole Primaire Bilingue Pombe	1.000.000 FCFA
7	Equipement de la radio communautaire « Ikou Ilong »	10.000.000 FCFA
8	Réhabilitation du centre de promotion de la femme et de la famille	14.000.000 FCFA
9	Ouverture de la route Mayem Mbock-Camp Bois	50.000.000 FCFA
10	Construction d'un dalot sur la route Mouanda-Mayemi	50.000.000 FCFA
11	Acquisition de l'appareillage dans le cadre de l'éducation inclusive à l'école primaire Aviation Groupe 2	5.000.000 FCFA
12	Appui en appareillage aux populations vulnérables	15.000.000 FCFA
N°	PROJETS SOUS FONDS PROPRES DE LA MAIRIE	MONTANTS
1	Le chantier de construction de 40 logements sociaux au quartier Bitoutouck	543.882.147 FCFA

2	La construction d'un complexe multisport situé à l'ancienne place de fête d'Eséka	Le budget de ce projet n'a pas encore été fixé/voté

V- PROJETS REALISES ET MONTANTS

Plusieurs projets ont été réalisés après constats lors des descentes sur le terrain pour la collecte des données et la vérification des travaux réalisés. Nous les avons donc classés dans les tableaux ci-après en fonction des années :

1- Projets réalisés en 2019

PROJETS REALISES 2019			
N°	PROJETS BIP	MONTANTS	POURCENTAGES DE REALISATION
1	Acquisition des équipements dans le cadre de l'éducation inclusive à l'école primaire-Aviation	4.999.000 FCFA	100%
2	Réhabilitation de l'école maternelle-Aviation	20.000.000 FCFA	100%
3	Réhabilitation de la toiture de la tribune du stade municipal d'Eséka	15.000.000 FCFA	100%
4	Equipement de 02 salles de classe en 60 tables-bancs et 02 bureaux de maître à l'école publique Groupe 2 d'Eséka	2.050.000 FCFA	100%
5	Réhabilitation de la route communale Bogso Limoug-Lihog	27.777.700 FCFA	100%
6	Aménagement de la route Eséka-Messondo	143.000 FCFA	100%
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école primaire groupe 2 d'Eséka	19.000.000 FCFA	100%
8	Construction d'un forage équipé de PMH-CFR	8.000.000 FCFA	100%
9	Electrification du village Lipombe-Silom	35.000.000 FCFA	100%
10	Construction d'un forage équipé de PMH-Viaduc	8.000.000 FCFA	100%

11	Acquisition d'un groupe électrogène	10.000.000 FCFA	100%
12	Ouverture de la radio communautaire d'Eséka	20.000.000 FCFA	100%

2- **Projets réalisés en 2020**

PROJETS REALISES 2020			
N°	PROJETS BIP	MONTANTS	POURCENTAGES DE REALISATION
1	Acquisition des équipements dans le cadre de l'éducation inclusive à l'école primaire groupe 2 Aviation	5.000.000 FCFA	100%
2	Equipement de la radio communautaire Ikou Ilong	10.000.000 FCFA	100%
3	Réhabilitation du centre de promotion de la femme et de la famille	5.000.000 FCFA selon le MINEPAT 14.000.000 Fcfa selon la Mairie	100%
4	Appui en appareillage aux populations vulnérables	1.500.000 FCFA	100%
5	Construction de huit latrines au stade municipal d'Eséka	4.200.000 FCFA	100%

VI- PROJETS NON REALISES/EN COURS

1- Tableau des projets en cours de réalisation de la Commune d'Eséka en 2019

Parmi les projets arrêtés en 2019 dans la Commune d'Eséka, d'aucuns sont encore en cours de réalisation parmi lesquels :

PROJETS EN COURS DE REALISATION DE 2019			
N°	PROJETS BIP	POURCENTAGES DE REALISATION	MONTANTS
1	Aménagement de la route Nyong-Camtour-préfecture et Hôpital de District d'Eséka	72% selon le MINEPAT	105.000.000 FCFA
N°	PROJETS SOUS FONDS PROPRES DE LA MAIRIE	POURCENTAGES DE REALISATION	MONTANTS
1	Chantier de 11 mini réseaux d'adduction d'eau à énergie solaire et un forage	5%	230.208.896 FCFA

2- Tableau des projets en cours de réalisation et non démarrés de la Commune d'Arrondissement d'Eséka en 2020

Parmi les projets arrêtés en 2020 dans la Commune d'Arrondissement d'Eséka, d'autres sont en cours de réalisation dont les suivants :

PROJETS EN COURS DE REALISATION DE 2020			
N°	PROJETS BIP	POURCENTAGES DE REALISATION	MONTANTS (AE)
1	Electrification du village Mandjack par Songbadjeck	(10%) selon la Mairie (59%) de taux de réalisation selon le MINEPAT	27.904.000FCFA (Cp) selon le MINEPAT
2	Ouverture de la route Mayem-Camp Bois	(40%) selon le MINEPAT (0%) selon la Mairie	50.000.000 FCFA
3	Equipement de l'école primaire de Pombe en 25 tables-bancs et 02 bureaux de maître	100% selon le MINEPAT	1.000.000 FCFA
4	Electrification du village Silom	5% selon le MINEPAT	17.147.000 FCFA
5	Electrification du village Pout-Kellé	80% selon le MINEPAT 10% selon la Mairie	20.533.000 FCFA
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'école primaire de POMBE	40% selon le MINEPAT 0% selon la Mairie	19.000.000 FCFA
7	Construction d'un dalot sur la route Mouanda-Mayemi	40% selon le MINEPAT	27.700.000 FCFA

PROJETS NON REALISES DE 2020			
N°	PROJETS SOUS FONDS PROPRES DE LA MAIRIE	POURCENTAGES DE REALISATION	MONTANTS
1	Chantier de 40 logements sociaux au quartier Bitoutouck	Suspendu/Non réalisé	543.882.147 FCFA
2	Construction d'un complexe multisport à l'ancienne place de fête Eséka	Projet dont la maturité n'est pas encore achevée ; le montant du projet n'a pas encore été fixé par le PNDP et la Mairie d'Eséka	

VII- CONSTATS

Après les descentes de terrain, plusieurs observations ont été faites par les jeunes délégués de quartier concernant lesdits projets. Mais parmi celles-ci, nous avons retenu les plus importantes à savoir :

1- Observations sur les projets de 2019

PROJETS 2019			
N°	PROJETS	OBSERVATIONS	RECOMMANDATIONS
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école primaire Aviation-Groupe 2	Les travaux sont visiblement achevés sur le terrain, mais les directeurs d'école rencontrés sont insatisfaits car la véranda de la première classe est déjà cassée et le bloc a été utilisé depuis quelques mois.	Le souhait de ces derniers serait que l'entreprise prestataire du projet corrige ce petit dégât causé après utilisation bien que le secrétaire général de la mairie ait déclaré qu'un projet réceptionné signifie qu'il a respecté le cahier des charges, qui peut être : un bon de commande (acquisition d'un bien ou un service d'une administration publique inférieur ou égal à 5 000 000 FCFA) ; une lettre-commande (égal à 5 000 000 FCFA et inférieur à 50 000 000 FCFA) ; un marché (au moins égal à 50 000 000 FCFA)
2	Ouverture (Installation) de la radio communautaire d'Eséka	Le bâtiment abritant la radio existe et elle est opérationnelle malgré le refus de la prise des photos par le personnel de cette radio, les jeunes enquêteurs se sont retrouvés dans l'obligation de contacter une source personnelle en interne pour le faire.	La prise de photo nécessite une autorisation de la hiérarchie, c'est-à-dire le Maire. En l'absence d'une autorisation, les enquêteurs devaient nécessairement se heurtés à un refus. Prendre des photos d'une institution à son insu et les publier est fortement déconseillé. Cependant, le fonctionnement de la Radio est transparent (selon la Mairie)

Le	Aménagement de la route Eséka-Messondo	La route a été aménagée mais à cause des intempéries, elle se dégrade peu à peu.	Il serait souhaité d'utiliser le bon matériel et plus de latérite par exemple pour éviter la dégradation rapide ou la non résistance de la route face aux intempéries. Bien que la route ait été aménagée, on aurait souhaité qu'il y'ait sur celle-ci des rigoles permettant le drain facile des eaux lors des pluies.
4	Réhabilitation de la route communale Bogso Limoug-Lihog	Le travail avait été effectué sur cette route mais elle s'est rapidement dégradée quelques mois après ; Les ponts n'ont pas été réalisés sur ce tronçon à cause de l'abandon du chantier par les travailleurs.	Prochainement, les riverains doivent avoir main mise sur le projet pour éviter le désordre afin que la localité puisse en bénéficier convenablement. Bien que cela n'est pas prévu dans le Code des Marchés Publics. En outre, les riverains ont-ils l'expertise leur permettant d'apprécier un projet (selon la Mairie)
5	Equipement de 02 salles de classe en 60 tables-bancs et 02 bureaux de maître à l'école publique Groupe 2 d'Eséka	Certaines données concernant le projet (le montant engagé, montant restant après réalisation dudit projet) sont introuvables au sein des services administratifs, le matériel a été livré malgré l'impossibilité pour la réalisation des photos car les responsables de l'établissement n'étaient pas là. Selon la Mairie, les archives du projet existent. Cette opération a nécessité la signature d'un bon de commande (BC) par le	Les jeunes enquêteurs souhaiteraient avoir un accès facile aux informations lors des prochaines descentes pour ne plus avoir à rencontrer ces difficultés sur le terrain.

		Maire à l'intention d'un prestataire. Le montant engagé pour le cas d'espèce signifie le montant toutes taxes comprises (TTC) du BC. L'économie budgétaire représente la différence entre l'enveloppe budgétaire et le montant TTC du BC.	
6	11 mini réseaux d'adduction d'eau à énergie solaire et un forage	Les études géophysiques sont en train d'être faites par les prestataires engagés pour la réalisation du projet. Il y'a de cela deux semaines environ, les points d'adductions en eaux qui viennent d'être implanté il y'a de cela deux semaines. Pendant que nous faisions la descente sur le terrain ça n'existait pas encore.	Les populations de cette localité auraient souhaité que ces projets soient réalisés dans les délais précis sans traîner comme c'est le cas actuellement car ceux-ci (les projets) répondent à leurs besoins. Selon le SG, le cahier des charges (pour ce qui nous concerne, le marché) est le référentiel d'évaluation d'un projet. Le délai de réalisation de ce projet est de cinq mois à compter du 06 août 2020. Ce marché ne « traîne » pas. Il revient donc aux enquêteurs de collecter la bonne information auprès de la Mairie et d'éclairer les populations
7	Réhabilitation de la toiture de la tribune du stade municipal d'Eséka	Les travaux sont réalisés à 100% ; la toiture est en bon état et protège le stade contre les intempéries	Projet réalisé
8	Acquisition d'un groupe électrogène à la morgue (HDE)	Le groupe électrogène est de bonne qualité et fonctionne bien.	Projet réalisé
9	Construction d'un forage équipé de PMH-Eséka	Le projet est réalisé et le forage est opérationnel	Projet réalisé
10	Construction d'un forage équipé de PMH-Boondjock Viaduc	Le forage fonctionne correctement	Projet réalisé

11	Electrification de Lipombe-Silom	Ce projet a été réalisé et les habitants de cette localité bénéficient convenablement de l'électricité dans leurs habitats.	Projet réalisé
12	Acquisition des équipements dans le cadre de l'éducation inclusive à l'école primaire-Aviation	Equipements disponibles et livrés	Projet réalisé
13	Réhabilitation de l'école maternelle-Aviation	Les travaux sont achevés	Projet réalisé
14	Aménagement de la route Nyong-Camtour Hôpital de District d'Eséka	(Selon les enquêteurs) Les travaux sur cette route n'ont pas encore démarré car la première phase du projet a été réalisée mais la deuxième phase ne l'est pas encore à cause de l'insuffisance des fonds (le montant alloué= 140.000.000 FCFA au projet n'a pas encore été reversé aux prestataires pour la 2ème phase du projet) (Selon la Mairie) C'est un projet en deux phases, phase 1 en 2018 et phase 2 en 2019. La phase 1 a commencé sans être achevé. Le pourcentage de réalisation physique en 2018 se situait à 38,76%. En outre, sans avoir terminé la phase 1 comme prévu, le prestataire a attaqué la phase 2, où il a atteint un taux de réalisation physique de 26,31%. Le problème	Le souhait serait que ce travail soit réalisé dans les brefs délais

		n’est pas « l’insuffisance des fonds ». Pour être reglé, l’adjudicataire doit terminer sa prestation, c’est-à-dire atteindre 100% de taux de réalisation physique.	

2- **Observations sur les projets de 2020**

PROJETS 2020			
N°	PROJETS	OBSERVATIONS	RECOMMANDATIONS
1	Construction d'un dalot sur la route Mouanda-Mayemi	Sur le terrain ce dalot visité est en cours de construction de +80%, les motos et les piétons y circulent déjà mais les voitures ne peuvent pas encore circuler bien qu'il y'aurait un peu de flou sur ce projet car il se pourrait que ledit projet soit disloqué en plusieurs projets et le SG de la Mairie indique qu'il n'a pas encore démarré. On ne saurait donc dire si le pont en cours de construction est ledit projet ou un quelconque projet. Le Maire a demandé au Délégué Départemental des Travaux Publics du Nyong-et-Kellé de procéder à un calage des quantités ; c'est-à-dire de redéfinir les quantités devant être finalement réalisées par le prestataire.	Il faudrait faire une mission de contrôle pour apporter un peu plus d'éclaircis sur la réalisation de ce projet.
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école primaire Pombe	Sur le terrain les riverains ont montré un bloc de deux salles en cours de construction, pas de voie d'accès fluide, dont 03 portes sur 04 sont placées, ces derniers sont heureux de l'avancement des travaux même si c'est à quelques jours de la rentrée,	Il faudrait apporter plus d'éclaircis sur ce projet pour savoir qui exactement est en train de le réaliser sur le terrain.

		cependant le SG de la mairie indique que les travaux n'ont pas encore commencé à cause du prestataire qui traîne. Les travaux ont connu du retard puis ont été suspendus (selon le SG).	
3	Réhabilitation du CPFF	Le Centre a bel et bien été réhabilité bien que la peinture commence déjà à se dégrader, les carreaux mis dans la salle qui commencent déjà à se fissurer en si peu de temps.	Il faudrait utiliser la bonne qualité du matériel la prochaine fois pour que le travail résiste un peu plus après sa réalisation (selon un enquêteur). Cependant le SG a précisé qu'il faudrait toujours partir du cahier des charges, pour comparer le travail prévu et travail réalisé. Le risque c'est de tirer des conclusions sans fondement.
4	Construction d'un complexe multisport à l'ancienne place de fête Eséka	Projet dont la maturation n'est pas encore achevée, c'est juste la maquette qui a été présentée ; le montant du projet n'est pas connu et ce dernier accuse un très grand retard dans sa réalisation.	La mairie doit solliciter des fonds externes si possible pour la réalisation du projet puisque c'est un projet sous fonds propres.
5	Chantier de construction de 40 logements sociaux au quartier Bitoutouck	Projet suspendu, la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) auprès de la commune d'Eséka a fait son travail suivant la réglementation en vigueur. Le Maire a procédé à l'attribution des marchés aux prestataires. Un soumissionnaire se sentant lésé a introduit un recours, qui a finalement abouti à	Il serait préférable prochainement que le projet soit attribué à un seul prestataire afin d'éviter les concurrences qui vont créer un meli-melo dans les travaux.

		l'annulation par le Ministre des Marchés Publics de l'attribution de la maîtrise d'œuvre (ou contrôle et surveillance). « Il est préférable prochainement que le projet soit attribué à un seul prestataire… ». Le Code de Marchés Publics prévoit la possibilité de scinder un marché en plusieurs lots. Et cela ne gêne aucunement la réalisation efficace du projet. Pour ce qui nous concerne, les travaux de construction sont divisés en neuf lots. Un adjudicataire détient les lots 1, 2, 3, 4 ; un autre adjudicataire, les lots 5, 6, 7, 8 ; un troisième adjudicataire, le lot 9.	
6	Equipement de la radio communautaire Ikou Ilong	Les équipements sont là, malgré la réalisation des images impossibles car le manque d'accord de la hiérarchie qui exigeait une note administrative locale en plus des ordres de mission qui leur avaient été remis.	Les enquêteurs souhaiteraient un accès facile aux informations lors des prochaines descentes. Selon la Mairie, La prise de photo nécessite une autorisation de la hiérarchie, c'est-à-dire le Maire. En l'absence d'une autorisation, les enquêteurs devaient nécessairement se heurtés à un refus. Prendre des photos d'une institution à son insu et les publier est fortement déconseillé. Cependant, le fonctionnement de la Radio est transparent.
7	Equipement en 25 tables-bancs et 02 bureaux de maître à	Les bancs n'ont pas encore été livrés, mais certains membres du personnel de	Les équipements de cette nature devraient en principe être livrés avant le début de la rentrée scolaire, ce qui n'avait pas été fait.

	l'Ecole Primaire Bilingue Pombe	l'école affirment que cela sera fait.	
8	Electrification du village Silom en BT et MT monophasée	Les travaux sont en arrêt à cause du mauvais état de la route dû aux fortes pluies.	Il faut aménager les voies d'accès vers cette localité, pour permettre d'achever rapidement le projet. Il faudrait aussi accentuer la communication autour dudit projet vers les populations locales.
9	Appui en appareillage aux populations vulnérables	Projet réalisé	Projet réalisé
10	Construction de huit latrines au stade municipal	Travaux réalisés	Projet réalisé
11	Acquisition des équipements dans le cadre de l'éducation inclusive à l'école primaire-Aviation	Les équipements ont été livrés et mis à la disposition du directeur	Projet réalisé
12	Ouverture de la route Mayem Camp bois	Selon le SG, L'enveloppe budgétaire est de 50 000 000 FCFA, mais le prestataire a soumissionné à 48 415 500 FCFA. Le taux de réalisation physique est de 0%.	Le projet doit être réalisé le plus tôt possible car il répond aux besoins de la population.
13	Electrification du village Mandjack passant par Song Badjeck	Selon le SG, l'enveloppe budgétaire est de 28 120 000 FCFA, mais le prestataire a soumissionné à 27 904 691 FCFA. Le taux de réalisation est de 10%.	L'entreprise prestataire devrait chercher à rencontrer les chefs de cette localité pour leur informer du début du projet car paraît-il, ces derniers ne sont pas au courant de la réalisation d'un projet quelconque dans leurs quartiers. Ces prestataires doivent aussi installer des plaques indiquant les travaux dans cette zone suggère un enquêteur.
14	Electrification du village Pout-Kelle Mapan	Les travaux sont en cours, les poteaux et le transformateur sont déjà	Il faudrait accélérer le projet qui traîne depuis quelques mois à être achevé, il faudrait aussi accentuer

		mis en place, sauf les fils du pilonne qui ne sont pas encore installés.	la communication autour du projet car les riverains ne connaissent plus son fonctionnement ni son évolution, l'entreprise devrait donc s'arranger à livrer le projet dans les brefs délais pour permettre à la population d'en bénéficier.

VIII- ANNEXES (Photos)

1 : Réhabilitation de la toiture de la tribune du stade municipal d'Eséka (Projet Bip 2019)

2 : Aménagement de la route Nyong-Camtour-préfecture d'Eséka (Projet Bip 2019)

3 : Equipement de 25 tables bancs et 02 bureaux de maître à l'école primaire Bilingue Pombe (Projet Bip2020)

4 : Acquisition d'un groupe électrogène à l'hôpital de district d'Eséka

5 : Poteaux pour l'électrification du village Pout-kelle Mapan 1

6 : Construction d'un forage équipé de PMH (Boondjock)

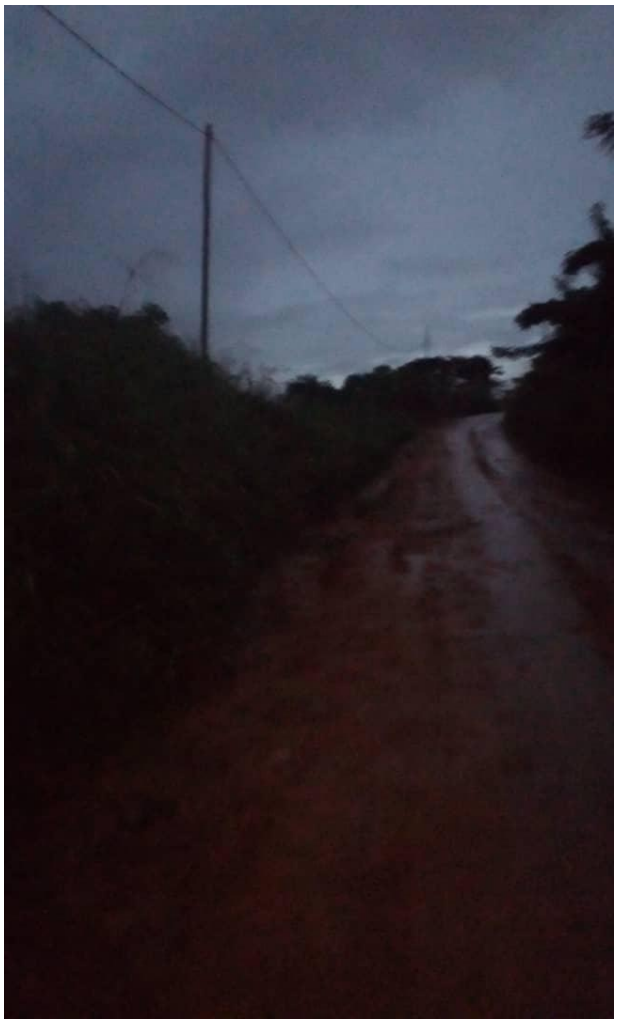

7 : Electrification du village Silom en BT et MT monophasée (Projet Bip 2020)

8 : Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'école primaire Eséka Groupe 2

9 : Construction d'un dalot sur la route Mouanda-Mayemi

10 : Construction d'un forage de CFR

11: Construction de huit latrines

12 : Aménagement de la route Eséka-Messondo

13 : Réhabilitation du centre de promotion de la femme et de la famille

14 : Ouverture de la radio communautaire d'Eséka

15 : Une vue des logements sociaux en construction

16 : Réhabilitation de la route communale Bogso Limoug-Lihog

17: Electrification Mandjack (Trouaison et dégagement pour l'installation des poteaux)

18: La route Camp Bois-Mayem Mbock

19: Réhabilitation de l'école maternelle d'application Aviation-Eséka

IX- PRESENTATION DES JEUNES DELEGUES DE LA COMMUNE ESEKA

Les jeunes délégués sont les bénéficiaires d'une formation sur le suivi et la participation des politiques publiques par le digital dans leur commune organisée par ADISI-Cameroun dans le cadre du projet d'appui à la décentralisation avec le soutien du NED. Ce projet est une extension du projet réalisé avec CIPESA dont les racines se trouvent dans le cadre du Projet PISCCA1 sous financement de l'Ambassade de France au Cameroun. Suite à cette formation, des descentes de terrain ont eu lieu pour un suivi participatif et citoyen afin d'évaluer les projets établis dans leur arrondissement. Cette initiative vise à collecter les données sur la mise en œuvre des politiques publiques, à les analyser et à élaborer un rapport qui sera adressés aux autorités municipales, parlementaires et administratives de la commune en particulier et du département en général.

Pour mieux les identifier, nous avons classé sur une fiche leurs adresses respectives

N°	Noms et Prénoms	Profession/Association	Quartiers
1	Nsegbe Jonas Daniel	Travailleur social et humanitaire	Linonoy
2	Yana Patrice	Enseignant	Viaduc
3	Ipea Um Mathias	Conseiller juridique	Eséka 2
4	Tombe Elouga Job Edmond	Administrateur local	Eséka 2
5	Liyeb Jacky Génévième	Travailleur social	Permanence
6	Olinga Ebalè Mechack	Délégué Psychodom	Permanence
7	Libong Igor	Enseignant	Tetem
8	Begue Ba Um Joseph	Amicale des Handballeurs du Nyong-Kelle	Camp Snec
9	Mbea Josué Junior	AHNYKE/Enseignant	Camp Snec
10	Bom Benjamin Joseph	Navigateur	Camp fonctionnaire
11	Ngo Yana Danielle	Etudiante	Malla
12	Lipem Suzanne	Journaliste	Permanence
13	Ngo Bisso Edith	Enseignante	Oxygène
